



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 647/2022 – Suprin/DP

Porto Alegre, 04 de julho de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Canoas/RS.

Assunto: RAAC de Sapiranga – Processo nº 056/2022.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 221/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no município de Sapiranga, Processo nº 056/2022, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) apresentado pela Superintendência Regional Sinos – SURSIN e validado pela Diretoria de Operações - DOP, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 056/2022
Município de Sapiranga - Vistoria realizada nos dias 06 e 07/04/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 28 de junho de 2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01 (EBA Vila Irma)				
1	2.5	CONSTATAÇÃO	Não há drenagem para a bomba reserva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado reparo do piso para posterior confecção das canaletas de escoamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Reunião com o líder da contratada para estipular um cronograma a ser cumprido com urgência.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar estrutura.</td> <td>15/08/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar estrutura.	15/08/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar estrutura.	15/08/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01 (EBA Vila Irma)				
2	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta da bomba reserva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado reparo do piso e a COP a fiação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Reunião com o líder da contratada para estipular um cronograma a ser cumprido com urgência.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar o piso e a fiação.</td> <td>15/08/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar o piso e a fiação.	15/08/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar o piso e a fiação.	15/08/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01 (EBA Vila Irma)
3	2.8	CONSTATAÇÃO	A EBA não apresenta bom estado de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado reparo do piso e a COP a fiação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Reunião com o líder da contratada para estipular um cronograma a ser cumprido com urgência.</p>			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Ajustar o piso e a fiação.	15/08/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02 (EBA Klein)
4	2.6	CONSTATAÇÃO	Tubulação enferrujada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A estrutura será desativada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar a estrutura.	15/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 (EBA Mundo Novo)
5	2.8	CONSTATAÇÃO	O telhado na casa de bombas está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado reparo no telhado.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar telhado.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 (EBA Mundo Novo)
6	2.8	CONSTATAÇÃO	A EBA não apresenta bom estado de conservação e organização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado recuperação do abrigo das bombas através do contrato de próprios e organização interna COP-CB.

PLANO DE AÇÃO: Reunião com o líder da contratada para estipular um cronograma a ser cumprido com urgência.



Ação	Prazo previsto
Ajustar abrigo.	30/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 (EBA Mundo Novo)
7	2.7	CONSTATAÇÃO	O acesso a escada interior da EBA não tem apoio que proporcione segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Por se tratar de carga e descarga de bombas não pode haver obstruções na entrada da EBAT. Acesso restrito.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 (EBA Mundo Novo)
8	2.3	CONSTATAÇÃO	Não há bomba reserva instalada no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada por acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estava sendo aguardado a troca do barrilete hidráulico para a instalação da bomba reserva. Será instalada a bomba reserva pela COP.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar bomba reserva.		Julho/2022.	


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 (EBA Mundo Novo)
9	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação na canaleta disposta de forma inapropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Adquirir os materiais necessários para readequação da fiação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Readequar a fiação.		Maio/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04 (EBA Liberdade)
10	2.8	CONSTATAÇÃO	Havia um cobertor no interior da casa de bombas, indicando que possivelmente pessoas não autorizadas acessaram o local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi retirado o cobertor e fechado.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

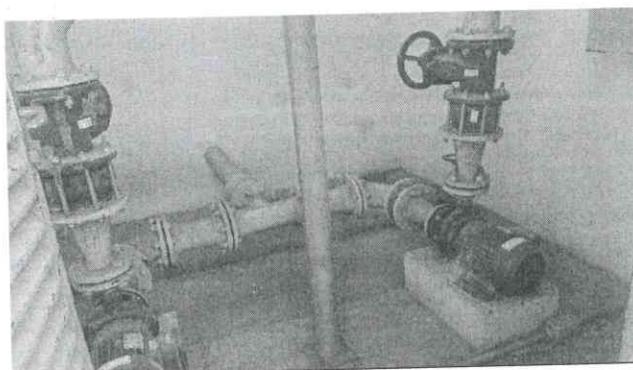

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05 (Colina)
11	2.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação estava quebrada e apoiada no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05 (Colina)
12	2.8	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de materiais depositados e água acumulada no entorno da estrutura da bomba, contribuindo para proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado a remoção dos materiais e água acumulada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	
			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12
13	2.8	CONSTATAÇÃO	Na entrada da EBA 12 havia diversos resíduos acumulados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada a remoção dos resíduos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12				
14	2.7	CONSTATAÇÃO	Não tem guarda-corpo no interior da EBA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Trata-se de uma plataforma de carga e descarga de grupos moto bombas pesados com auxílio de guinchos hidráulicos ou talhas, sendo inapropriado instalar qualquer apoio que obstrua a movimentação de cargas naquele ponto de entrada. Portanto, inviável instalação de qualquer tipo de guarda corpo para a execução dos trabalhos naquele local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12				
15	2.4	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de um vazamento na tubulação de recalque da bomba. O vazamento fica localizado, especificamente, no flange da peça				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será tomado as devidas providencias para sanar o problema apontado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar vazamento.</td> <td>Maior/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	Maior/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	Maior/2023.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12A
16	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05 (Colina)
17	4,8	CONSTATAÇÃO	As informações presentes no ANEXO II - Ficha Técnica do SAA diferem da identificação das estruturas no local. No endereço verificou-se que a identificação utilizada foi EBA 02 e no Anexo II consta como EBA Klein.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será atualizado no próximo relatório.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Atualizar.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
18	4.8	CONSTATAÇÃO	Presença de fezes de animais no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza de local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos realizar a remoção das fezes de animais no local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover as fezes.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
19	4.8	CONSTATAÇÃO	Grande quantidade de materiais acumulados na grade de retenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada a remoção dos materiais acumulados.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
20	4.8	CONSTATAÇÃO	Presença de lodo na casa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza na casa de bomba.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover lodo.	Maior/2023.

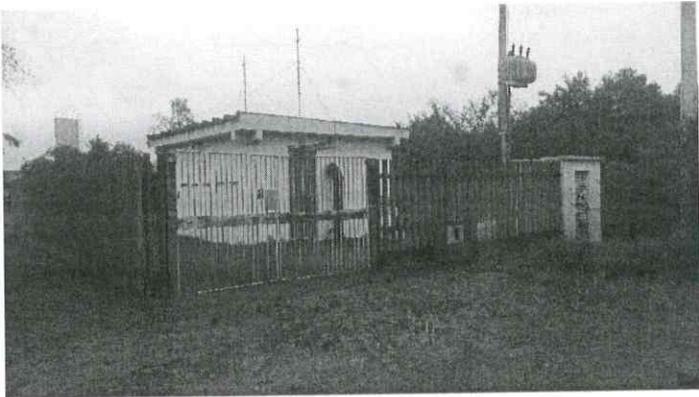NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02				
21	4.8	CONSTATAÇÃO	No local constatou-se a necessidade de corte da vegetação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada a limpeza no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table> 				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Centenário				
22	5.3	CONSTATAÇÃO	ETE não possui placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Centenário
23	5.19	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na área de coleta do efluente para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.




2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removido material acumulado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Remover material.		Dezembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Centenário
24	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de poda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar remoção da poda.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Remover poda.		Agosto/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Horizonte
25	5.4	CONSTATAÇÃO	O portão secundário de acesso à ETE não estava cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi inserido o cadeado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Horizonte
26	5.19	CONSTATAÇÃO	Na entrada da ETE havia diversos resíduos de poda acumulados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi removido o resíduo de poda.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	

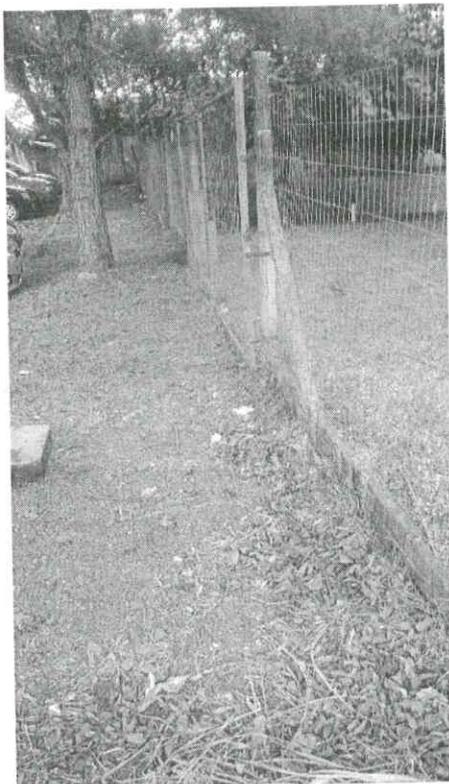

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Horizonte
27	5.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado e a altura do cercamento não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A cerca foi ajustada.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Cooperhabitar
28	5.4	CONSTATAÇÃO	Presença de fezes de animais no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos realizar a remoção das fezes de animais no local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover as fezes.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Cooperhabitar
29	5.4	CONSTATAÇÃO	A ETE em alguns pontos está cercada por arame farpado, o que facilita o acesso de pessoas não autorizadas ao local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Através do contrato de próprios será instalada a cerca.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Maior/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Floresta
30	5.18	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos sólidos na área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esta estação de tratamento de esgoto, conforme já foi informado anteriormente, está sob responsabilidade do empreendedor, pois quando do recebimento da Corsan através do Departamento de Obras da Região Metropolitana – DEOB-MET, o empreendedor assinou declaração (em anexo) responsabilizando-se pela conservação, operação e manutenção. Além do mais, a Licença de Operação (LO Nº 176/2019 – SEMAPE) ainda está no nome do empreendedor, e para que a licença de operação seja transferida para a Corsan, o empreendedor deverá seguir o que determina à Resolução Nº 22/2017-GP (em anexo).

Salientamos também, que os representantes da Cooperativa de Conjuntos e Loteamentos Habitacionais – COOPERJUNTOS, estão cientes de suas responsabilidades conforme pode ser comprovado através da Ata de Reunião Cope-Sin – nº 003/2021 (em anexo).

Desta forma, também entendemos que os questionamentos da Agesan, deverão ser direcionados a COOPERJUNTOS

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Floresta
31	5.19	CONSTATAÇÃO	As tubulações utilizadas para coleta de amostras estavam destampadas propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esta estação de tratamento de esgoto, conforme já foi informado anteriormente, está sob responsabilidade do empreendedor, pois quando do recebimento da Corsan através do Departamento de Obras da Região Metropolitana – DEOB-MET, o empreendedor assinou declaração (em anexo) responsabilizando-se pela conservação, operação e manutenção. Além do mais, a Licença de Operação (LO Nº 176/2019 – SEMAPE) ainda está no nome do empreendedor, e para que a licença de operação seja transferida para a Corsan, o empreendedor deverá seguir o que determina à Resolução Nº 22/2017-GP (em anexo).

Salientamos também, que os representantes da Cooperativa de Conjuntos e Loteamentos Habitacionais – COOPERJUNTOS, estão cientes de suas responsabilidades conforme pode ser comprovado através da Ata de Reunião Cope-Sin – nº 003/2021 (em anexo).

Desta forma, também entendemos que os questionamentos da Agesan, deverão ser direcionados a COOPERJUNTOS

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Floresta
32	5.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de saída do efluente da ETE está obstruída, o que impede o fluxo do mesmo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esta estação de tratamento de esgoto, conforme já foi informado anteriormente, está sob responsabilidade do empreendedor, pois quando do recebimento da Corsan através do Departamento de Obras da Região Metropolitana – DEOB-MET, o empreendedor assinou declaração (em anexo) responsabilizando-se pela conservação, operação e manutenção. Além do mais, a Licença de Operação (LO N° 176/2019 – SEMAPE) ainda está no nome do empreendedor, e para que a licença de operação seja transferida para a Corsan, o empreendedor deverá seguir o que determina à Resolução N° 22/2017-GP (em anexo).
Salientamos também, que os representantes da Cooperativa de Conjuntos e Loteamentos Habitacionais – COOPERJUNTOS, estão cientes de suas responsabilidades conforme pode ser comprovado através da Ata de Reunião Cope-Sin – n° 003/2021 (em anexo).
Desta forma, também entendemos que os questionamentos da Agesan, deverão ser direcionados a COOPERJUNTOS

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Floresta
33	5.4	CONSTATAÇÃO	O cercamento da área está danificado em alguns pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esta estação de tratamento de esgoto, conforme já foi informado anteriormente, está sob responsabilidade do empreendedor, pois quando do recebimento da Corsan através do Departamento de Obras da Região Metropolitana – DEOB-MET, o empreendedor assinou declaração (em anexo) responsabilizando-se pela conservação, operação e manutenção. Além do mais, a Licença de Operação (LO N° 176/2019 – SEMAPE) ainda está no nome do empreendedor, e para que a licença de operação seja transferida para a Corsan, o empreendedor deverá seguir o que determina à Resolução N° 22/2017-GP (em anexo).
Salientamos também, que os representantes da Cooperativa de Conjuntos e Loteamentos Habitacionais – COOPERJUNTOS, estão cientes de suas responsabilidades conforme pode ser comprovado através da Ata de Reunião Cope-Sin – n° 003/2021 (em anexo).
Desta forma, também entendemos que os questionamentos da Agesan, deverão ser direcionados a COOPERJUNTOS

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Floresta
34	5.18	CONSTATAÇÃO	Algumas estruturas estavam destampadas ou com as tampas quebradas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esta estação de tratamento de esgoto, conforme já foi informado anteriormente, está sob responsabilidade do empreendedor, pois quando do recebimento da Corsan através do Departamento de Obras da Região Metropolitana – DEOB-MET, o empreendedor assinou declaração (em anexo) responsabilizando-se pela conservação, operação e manutenção. Além do mais, a Licença de Operação (LO Nº 176/2019 – SEMAPE) ainda está no nome do empreendedor, e para que a licença de operação seja transferida para a Corsan, o empreendedor deverá seguir o que determina à Resolução Nº 22/2017-GP (em anexo).
Salientamos também, que os representantes da Cooperativa de Conjuntos e Loteamentos Habitacionais – COOPERJUNTOS, estão cientes de suas responsabilidades conforme pode ser comprovado através da Ata de Reunião Cope-Sin – nº 003/2021 (em anexo).
Desta forma, também entendemos que os questionamentos da Agesan, deverão ser direcionados a COOPERJUNTOS

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Primavera
35	5.3	CONSTATAÇÃO	ETE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Informamos que, por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, a mesma, não possui obrigação em realizar a limpeza desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela Agesan, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça (Ag. Instr. N.º 70082943333, 4ª Câm. Cível/TJRS). Informamos que a CORSAN não recebeu a ETE Primavera, pois, essa ETE está sob responsabilidade do empreendedor até que apresente os resultados das análises, e comprove eficiência do sistema de tratamento. Segue-se a Resolução nº 22/2017-GP (em anexo), quanto ao procedimento para alteração da responsabilidade e/ou regularização ambiental de sistemas de esgotamento sanitário em nome de terceiros, conforme regramento oficial interno a ser observado para tratamento desse tipo de situação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Primavera
36	5.18	CONSTATAÇÃO	Local não apresenta condições de segurança operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Informamos que, por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, a mesma, não possui obrigação em realizar a limpeza desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela Agesan, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça (Ag. Instr. N.º 70082943333, 4ª Câm. Cível/TJRS). Informamos que a CORSAN não recebeu a ETE Primavera, pois, essa ETE está sob reponsabilidade do empreendedor até que apresente os resultados das análises, e comprove eficiência do sistema de tratamento. Segue-se a Resolução nº 22/2017-GP (em anexo), quanto ao procedimento para alteração da responsabilidade e/ou regularização ambiental de sistemas de esgotamento sanitário em nome de terceiros, conforme regramento oficial interno a ser observado para tratamento desse tipo de situação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanque Séptico - Primavera
37	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Informamos que, por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, a mesma, não possui obrigação em realizar a limpeza desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela Agesan, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça (Ag. Instr. N.º 70082943333, 4ª Câm. Cível/TJRS). Informamos que a CORSAN não recebeu a ETE Primavera, pois, essa ETE está sob reponsabilidade do empreendedor até que apresente os resultados das análises, e comprove eficiência do sistema de tratamento. Segue-se a Resolução nº 22/2017-GP (em anexo), quanto ao procedimento para alteração da responsabilidade e/ou regularização ambiental de sistemas de esgotamento sanitário em nome de terceiros, conforme regramento oficial interno a ser observado para tratamento desse tipo de situação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
38	6.12	CONSTATAÇÃO	A superfície do reservatório necessita de melhorias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que, estamos com o contrato de próprios vigente, a pouco tempo. Fizemos vistorias de alguns serviços junto com a contratada, porém a mesma não conseguiu realizar os orçamentos estipulados, pois alega dificuldade em orçar, pelo fato de ter um grande volume de demandas. Mesmo assim, estamos marcando uma reunião com o objetivo de estreitar a relação para que as demandas que envolvam a fiscalização da reguladora, tenham urgência na conclusão. Portanto, através do contrato de próprios será realizado a melhoria na superfície.

PLANO DE AÇÃO: Reunião com o líder da contratada para estipular um cronograma a ser cumprido com urgência.


Ação	Prazo previsto
Ajustar superfície.	15/08/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
39	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos de obra depositados na entrada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi removido resíduos de obra depositados.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

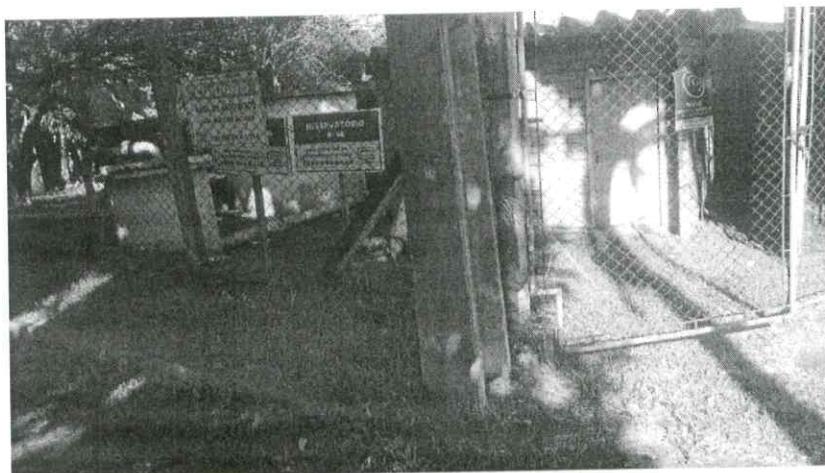

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-15
40	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos de poda depositados na entrada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Vamos remover a poda na entrada do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover a poda.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16
----	--------------	---------	------



41	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava aberta, permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Através do contrato de caldeiraria será confeccionada uma nova tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tampa.		Dezembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16
42	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de gordura da casa vizinha dentro na área do reservatório e destampada, o que contribui para a proliferação de insetos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitamos para a moradora, vizinha do R-16, a retirada da caixa de gordura.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Retirar a caixa de gordura.		Maio/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A
43	6.12	CONSTATAÇÃO	Manter as tubulações armazenadas de forma organizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi removido as tubulações armazenadas no R-16A.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A				
44	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento próximo a base do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a manutenção com o novo contrato de manutenção de estruturas hidráulicas. A Licitação já foi homologada, no aguardo da elaboração do Termo de Contrato e assinatura.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar vazamento.</td> <td>31/10/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	31/10/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	31/10/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A				
45	6.10	CONSTATAÇÃO	Cabo do para-raio cortado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Após avaliação técnica verificou-se que não há necessidade de SPDA neste reservatório apoiado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover a estrutura obsoleta.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover a estrutura obsoleta.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Remover a estrutura obsoleta.	Agosto/2022.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-17
46	6.8	CONSTATAÇÃO	O cabo do para-raios antigo está mais alto do que o novo, o que irá prejudicar o adequado funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada interligação entre os sistemas.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Interligar os sistemas.	Maior/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-17
47	6.12	CONSTATAÇÃO	A tampa da caixa de manobra não proporciona o fechamento total da abertura, possibilitando a entrada de água e de resíduos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Através do contrato de caldeiraria será confeccionada uma nova tampa.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos espalhados na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi retirado os resíduos espalhados.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-18				
49	6.3	CONSTATAÇÃO	Extravasamento contínuo do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a manutenção com o novo contrato de manutenção de estruturas hidráulicas. A Licitação já foi homologada, no aguardo da elaboração do Termo de Contrato e assinatura.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar vazamento.</td> <td>Maio/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	Maio/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	Maio/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-18A				
50	6.6	CONSTATAÇÃO	O controle de nível estava com a fiação danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a reparação e proteção devida dos cabos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cabos.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cabos.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cabos.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-18A
----	--------------	---------	-------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

51	6.4	CONSTATAÇÃO	A entrada de inspeção não estava com a tampa de vedação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Através do contrato de caldeiraria e solda será realizado os devidos reparos e adequações</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedar tampa.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedar tampa.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Vedar tampa.	Dezembro/2022.						

52	6.4	CONSTATAÇÃO	R-20 A tela da abertura de inspeção está danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação da tela de proteção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	Agosto/2022.						


53	6.5	CONSTATAÇÃO	R-20 Ausência de tela de proteção no extravasor.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação da tela de proteção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	Agosto/2022.						

54	6.12	CONSTATAÇÃO	R22 Excesso de vegetação na caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a limpeza no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza.		05/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
55	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada a limpeza do local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	
			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
56	6.11	CONSTATAÇÃO	Acesso á área do R-23 é precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-23 já foi realizada a interligação de rede, vide foto em anexo. Até o dia 27/06 será isolado definitivamente.</p>			

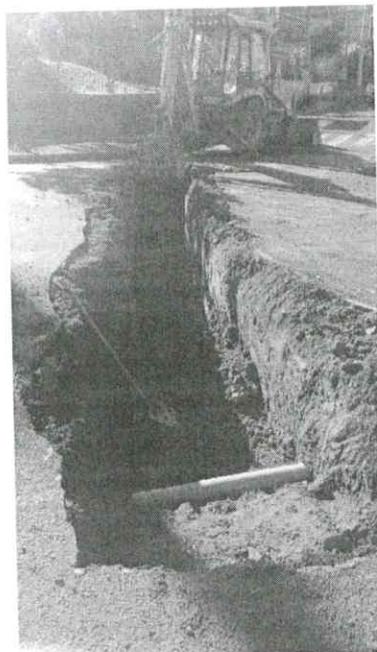

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar R-23.	27/06/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
57	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-23 já foi realizada a interligação de rede. Até o dia 27/06 será isolado definitivamente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar R-23.	27/06/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
58	6.11	CONSTATAÇÃO	A estrutura do reservatório está oxidada e não é segura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-23 já foi realizada a interligação de rede. Até o dia 27/06 será isolado definitivamente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar R-23.	27/06/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-24
59	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de materiais no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os materiais serão removidos.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover materiais.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
60	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos de poda depositados na entrada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada a limpeza do local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25				
61	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta grelhas nas câmaras de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que estamos tendo muitas demandas envolvendo o contrato de caldeiraria. Nesse sentido, a contratada não tem mão de obra suficiente para atender todas demandas ao mesmo tempo. Mesmo assim, iremos atender as demandas relacionadas a caldeiraria, e essa demanda já está no cronograma para atendimento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>30/08/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	30/08/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	30/08/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-27				
62	6.8	CONSTATAÇÃO	Não tem sinalização de obstáculo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não é enquadrado em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
63	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório está desativado sem previsão de retorno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	
			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
64	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios e sinalização de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório está desativado sem previsão de retorno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
65	6.3	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamentos na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.



2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório está desativado sem previsão de retorno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28				
66	6.3	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório está desativado sem previsão de retorno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28				
67	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não está cercada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório está desativado sem previsão de retorno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
68	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no suspiro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Tela foi instala antes do reservatório ser desativado.</p>			

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-29
69	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raios está acima do nível do sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Após vistoria técnica verificou-se que não é necessário o sistema sinalizador conforme portaria da aeronáutica.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover sinalizador.	15/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-30
70	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos espalhados na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a remoção dos resíduos
 Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
 Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-30
71	6.12	CONSTATAÇÃO	A drenagem da caixa de manobra do reservatório não estava adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a adequação da drenagem, através do contrato de apoio operacional.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar drenagem.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
72	6.11	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área e nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-31 foi incluído no cronograma para execução da interligação de rede até dia 01/07 e assim também remover o reservatório do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar reservatório.	01/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
73	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-31 foi incluído no cronograma para execução da interligação de rede até dia 01/07 e assim também remover o reservatório do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
------	----------------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Desativar reservatório.	01/07/2022.
-------------------------	-------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
74	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-31 foi incluído no cronograma para execução da interligação de rede até dia 01/07 e assim também remover o reservatório do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar reservatório.	01/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
75	6.11	CONSTATAÇÃO	Patamar elevado do reservatório sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-31 foi incluído no cronograma para execução da interligação de rede até dia 01/07 e assim também remover o reservatório do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar reservatório.	01/07/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
76	6.2	CONSTATAÇÃO	Não possui cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/05/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA - NC apontada no Processo n. 029/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O R-31 foi incluído no cronograma para execução da interligação de rede até dia 01/07 e assim também remover o reservatório do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desativar reservatório.	01/07/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
77	7.13	CONSTATAÇÃO	Os vazamentos na rede são verificados somente diante de solicitação do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle de vazamentos ocultos da rede de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Monitoramos constantemente a pressão via CCO ou manometria, assim quando a pressão de um setor se modifica muito temos indício de vazamentos. Setores com histórico de vazamentos sofrem varreduras de pesquisa com geofone de forma periódica.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Controlar vazamento.	Periódico.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
78	7.11	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a existência de vazamento na Rua da Ladeira (entre os números 493 e 593, próximo a Av. 20 de setembro).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O vazamento foi consertado no dia 02/05/22, OS: 17423708.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.


Ação	Prazo previsto
Concluída.	Concluída.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
79	7.15	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível ao público a carta de serviços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não disponibilizar carta de serviços ao público.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Está disponível a carta de serviço, conforme foto em anexo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

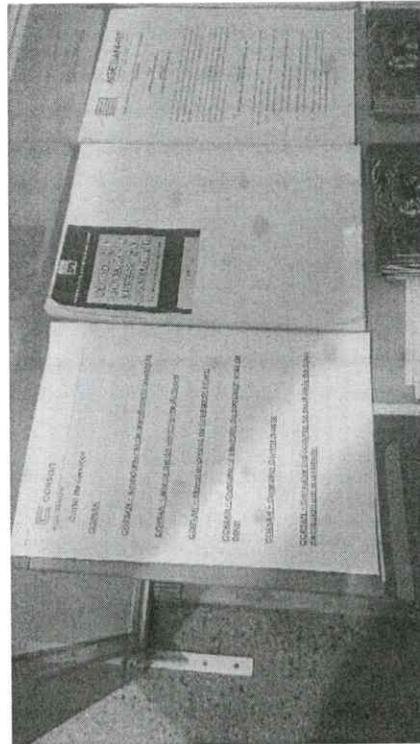

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
80	7.5	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidores instalados em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água na rede de distribuição.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O município recebe água da ETA de Campo Bom através de duas adutoras, atualmente temos medição em uma dessas adutoras de DN 400, na outra adutora já temos o medidor disponível e estamos aguardando peças para instalação. Para outros DMCs temos um mapeamento dos locais e esperamos fazer um avanço nos próximos três anos.

PLANO DE AÇÃO:

ONDE FAZER?	QUEM VAI FAZER?	COMO VAI FAZER?	PRAZO
Captação	Não tem bruta		
DN 400 Policia Rodoviária Estadual	DECOPE	Aferir o medidor.	Julho/2022
DN 300 FC, No IFSUL	US e Wagner	Comprar e Instalar o medidor.	29/06/2024



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Saída do R-17	DECOPE	1 - Realizar pitometria para dimensionar o medidor; 2 - Comprar e Instalar o medidor.	29/06/2024
Ação		Prazo previsto	
Instalar macromedidores.		29/06/2024.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
81	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede são verificadas somente diante de solicitação do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Nos municípios onde possuímos CCO, os pontos de pressão estão estrategicamente instalados em locais onde a pressão pode nos indicar algum problema, pontas de rede, saídas de recalques e regiões de grande consumo, permitindo assim monitoramento constante para atender o atendimento dentro das pressões determinadas. Caso por algum motivo as pressões estejam acima de 50 m.c.a de forma constante, atuamos com a instalação de válvulas redutoras de pressão ou inversor de frequência no bombeamento, desde que esse equipamento não prejudique o atendimento de outras economias do setor.
Para os locais onde não tem CCO, conhecemos os pontos críticos e fazemos monitoramento periódico ou por demanda do consumidor através de manometria ou datalogger de pressão.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação		Prazo previsto	
Controlar pressão.		Periódico.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
82	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de substituição das redes de distribuição de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O plano de substituição de rede, envolve a substituição de alguns lugares.

PLANO DE AÇÃO:

Segue abaixo programação de substituição de rede em Sapiranga:

- Ampliação de 1570m de adutora DN 300 - Bairro Vila Irma – Previsão Agosto/2023
- Ampliação de 170m adutora DN 250 – Monte Castelo – Setembro/2023
- Ampliação de 6.000m de adutora – DN 300 – Bairro Amaral Ribeiro – Previsão Maio/2024



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Substituir redes.	Mai/2024.


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bosque
83	5.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o relatório analítico dos efluentes da ETE Bosque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foram encaminhados à AGESAN relatórios de análises das ETES de Saporanga (Centenário, Cooperhabitar/São Luiz, Munari, Horizonte e Bosque) dos anos de 2021 e 2022 (até março); com relação à ETE Bosque, informamos ter sido efetivado monitoramento de julho a outubro/2021, com retomada de monitoramento a partir de maio/22 (já efetivada coleta de amostras em 23/05/22). Em anexo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Prestar informações.	Concluído.


Carlos Marcio Galarça Pereira
Superintendente SURSN
Matrícula 175240
Carlos Marcio Galarça Pereira
Superintendente da Regional Sinos
Matrícula 175240


Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM-SIN
Matrícula 175224



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 647/2022 – Suprin/DP

Porto Alegre, 04 de julho de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Canoas/RS.

Assunto: RAAC de Sapiranga – Processo nº 056/2022.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 221/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no município de Sapiranga, Processo nº 056/2022, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) apresentado pela Superintendência Regional Sinos – SURSIN e validado pela Diretoria de Operações - DOP, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.
