



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 785/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 23 de junho de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Pressões de Verão (março/2023),
Processo 041-P/2023.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 552/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF, Processo nº 041-P/2023, referente à fiscalização de pressões de verão realizada em diversos municípios, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – Raac apresentado pela Superintendência Regional Sinos – Surin para os Municípios de **Campo Bom, Estância Velha e Parobé**.

No que tange aos Municípios de **Guaíba, Sentinela do Sul, Taquara, São Vicente do Sul, Santiago e Nova Esperança do Sul**, reiteramos que a Corsan não irá apresentar qualquer manifestação, visto que a situação dos contratos de regulação destes municípios ainda não está devidamente regularizada, ou seja, a regulação ainda não está a cargo da Agesan nesses municípios.

Como já informado anteriormente, os Termos de Convênio de Regulação e os Contratos de Programa firmados entre Agesan e os municípios acima listados estão em análise pela equipe de Governança da Companhia, não estando, portanto, devidamente anuídos por este Prestador, condicionante para validade dos referidos instrumentos jurídicos, nos termos do Art. 23, § 1º-B, da Lei 11.445/2007, com redação dada pela Lei 14.026/2020.

Reiteramos, portanto, que, enquanto as questões regulamentares não estiverem superadas, **a Corsan não apresentará qualquer consideração em processo fiscalizatório irregular dessa Agência**.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.
Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Diretora-Presidente.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão

Município de Estância Velha - processo n. 041-P/2023

Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

Município de Campo Bom - processo n. 023-P/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 23 de junho de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 57,28 mca) na Rua Presidente Lucena, n. 1262 - coordenadas: 29°39'59,698"S e 51°10'14,694"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Estância Velha - processo n. 041-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 57,28 mca) na Rua Presidente Lucena, n. 1262 - coordenadas: 29o39'59,698"S e 51o10'14,694"W O setor onde o imóvel está localizado tem sua pressão regulada pelo reservatório Encosta do Sol (elevado, Rua das Camélias), que tem cotas em torno de 130m. A cota do imóvel é de cerca de 74m, justificando a pressão aferida pela AGESAN. É possível diminuir a pressão e realizar o atendimento dentro dos padrões do regulamento de serviços, para isso deve ser instalada VRP na rede em PVC PBA DN100 na Rua Dos Cravos próximo à esquina da Rua dos Gerânios, com controle de pressão a realizar no fim da Rua das Primaveras, com cotas em torno de 104m.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
4	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 52,94 mca) na Rua Leopoldo Hartz, 41 - coordenadas: 29°38'13,566"S e 50°50'56,82"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi ajustado a pressão.


The screenshot shows a software interface with a menu bar (Atendimento, Cadastro, Medição, Faturamento, Cobrança, Arrecadação, Configurações, Relatórios, Patrologia, Acessórios, Módulos Comerciais) and a main window displaying a service history. The service list includes: 189 - Vistoria Falta de Pressão - Indível, 47 - Medição de Pressão, 150 - Substituição dos Lances das 1, 34 - Serviços no Quadro, 18 - Exurgo no Quadro, 130 - Serviço de Consentimento Vassamento, and 272 - Medição de Pressão Final. To the right, there is a photograph of a pressure gauge with a white face and black markings, showing a reading of approximately 10 kg/cm². The gauge has two scales: the outer scale is in kg/cm² (0 to 10) and the inner scale is in psi (0 to 150). The needle points to the 10 mark on the kg/cm² scale. The photo is timestamped 21/08/2023 16:00:57.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
5	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 1,64 mca) na Rua Paraná, n. 119 - coordenadas: 29°37'57,432"S e 50°50'18,33"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

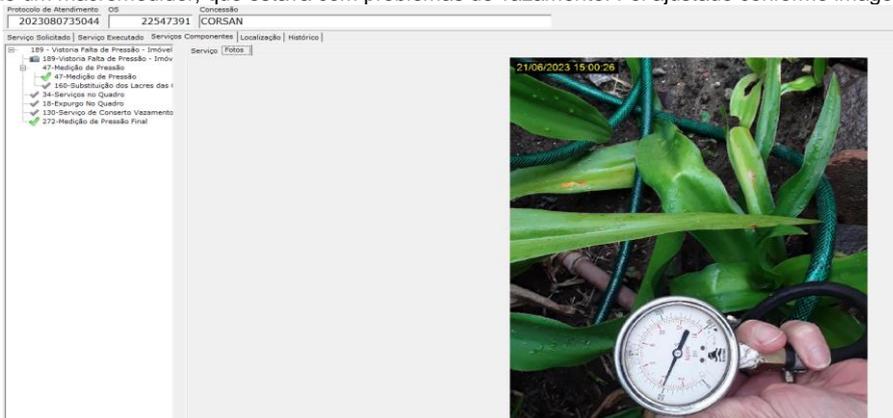


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
6	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 3,54 mca) na Rua Manoel Dutra de Vargas, n. 316 - coordenadas: 29°37'29,334"S e 50°49'38,214"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

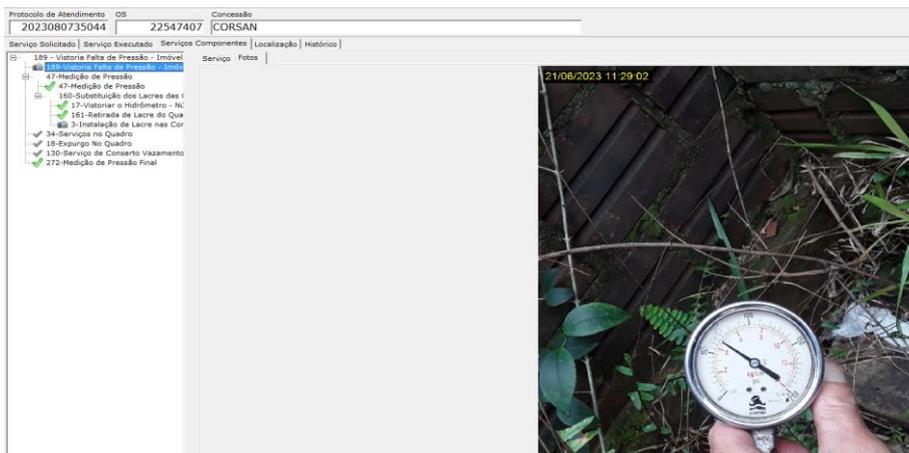


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
7	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = -0,32 mca) na Rua São Januário, n. 31 - coordenadas: 29°37'16,002"S e 50°49'53,16"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

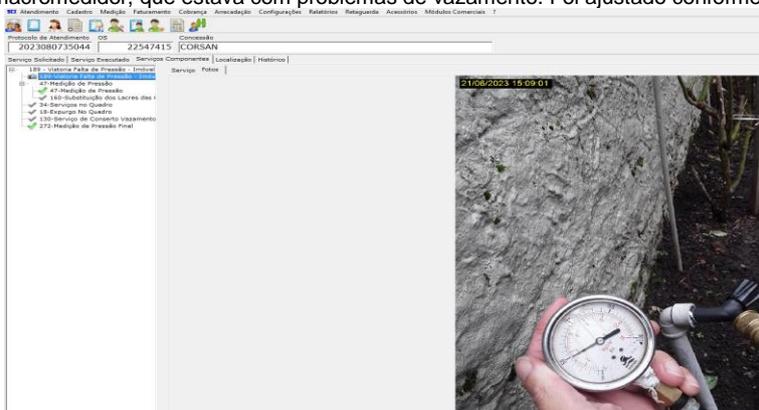


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
----	--------------	---------	------------------------------

8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = -0,29 mca) na Rua Porto Alegre, n. 720 - coordenadas: 29°38'28,632"S e 50°51'40,698"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

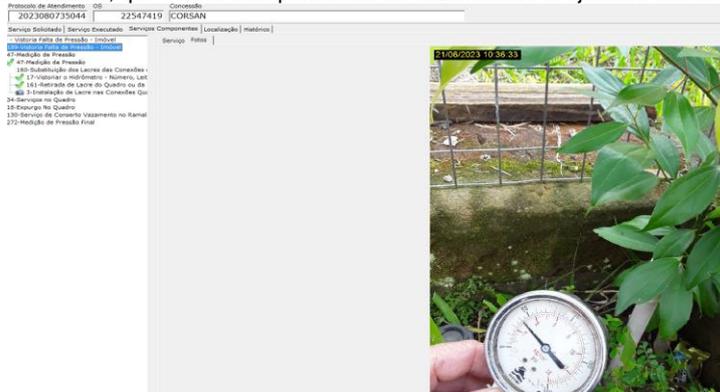

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
9	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 8,46 mca) na Rua Novo Hamburgo, n. 608 - coordenadas: 29°38'36,474"S e 50°51'35,394"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023


MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será ajustado o setpoint do reservatório e da elevatória para atender a pressão requerida.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
10	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 1,19 mca) na Rua Veranópolis, n. 661 - coordenadas: 29°38'23,91"S e 50°51'36,828"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

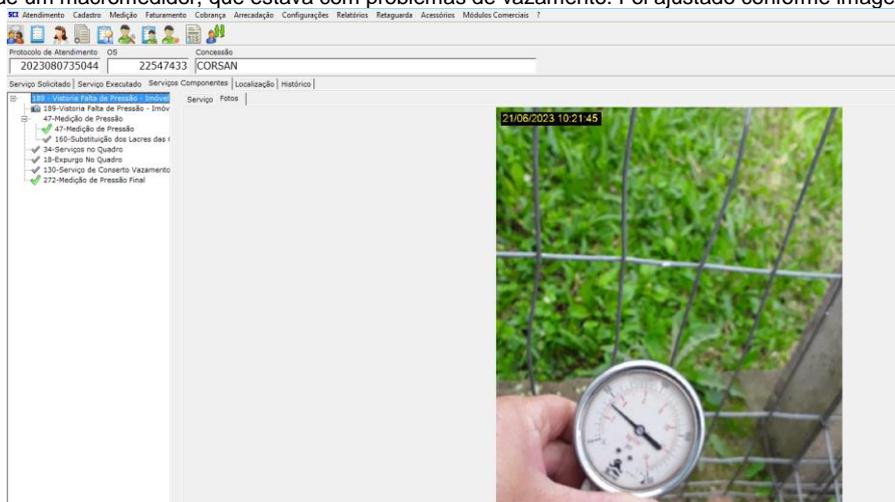


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
11	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = -0,28 mca) na Rua Nicolau Willers, n. 251 - coordenadas: 29°38'27,51"S e 50°50'14,01"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

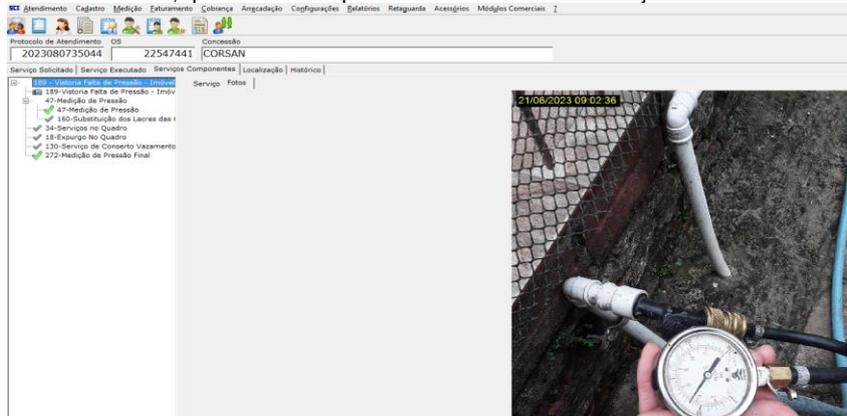


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
12	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 0 mca) na Rua da Lapa, n. 30 - coordenadas: 29°38'30,162"S e 50°50'5,922"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

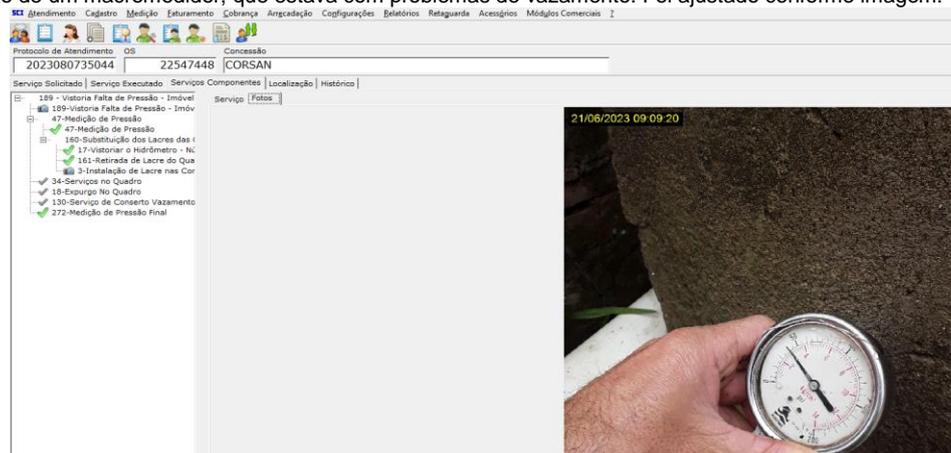


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
13	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 0,04 mca) na Rua Antônio Veríssimo da Silva, n. 135 - coordenadas: 29°38'55,494"S e 50°48'51,714"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi causada pela instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Ajustado conforme imagem.

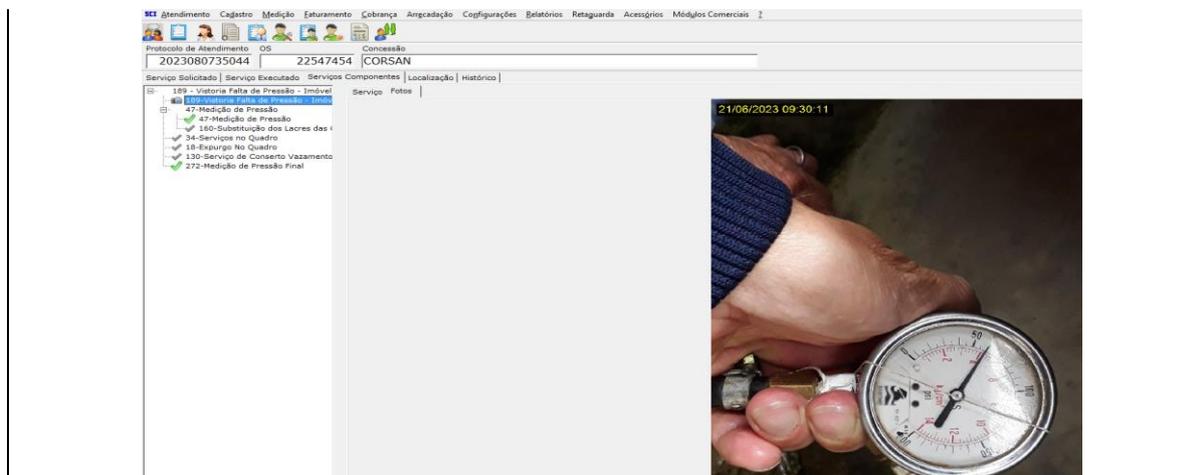


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
14	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 0,66 mca) na Rua Andrade Neves, n. 178 - coordenadas: 29°38'19,812"S e 50°48'58,524"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

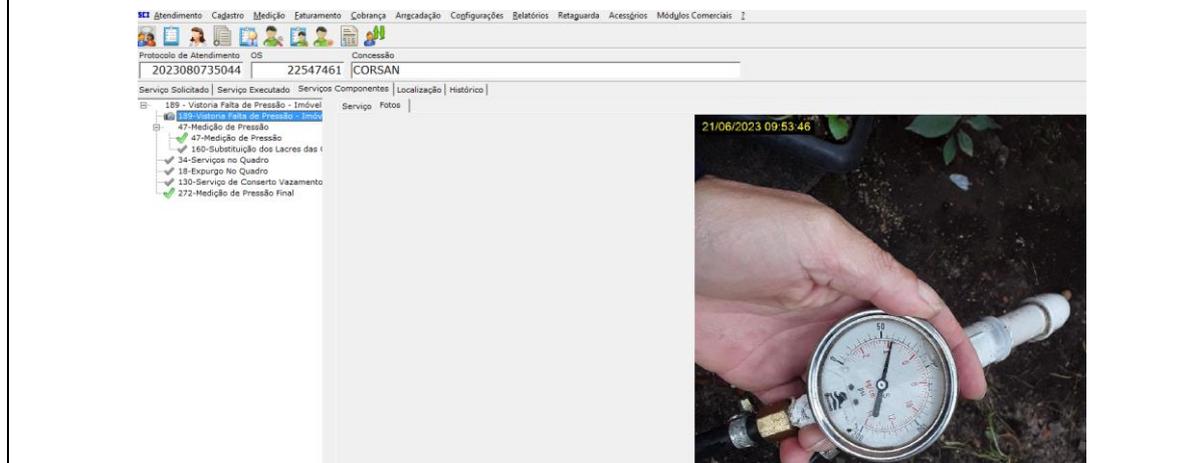


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água

15	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 5,15 mca) na Rua Nickdário Hartz, n. 20 - coordenadas: 29°37'53,208"S e 50°49'1,704"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Parobé - processo n. 048-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A pressão da rede de distribuição não atingiu valor estipulado por causa da instalação de um macromedidor, que estava com problemas de vazamento. Foi ajustado conforme imagem.

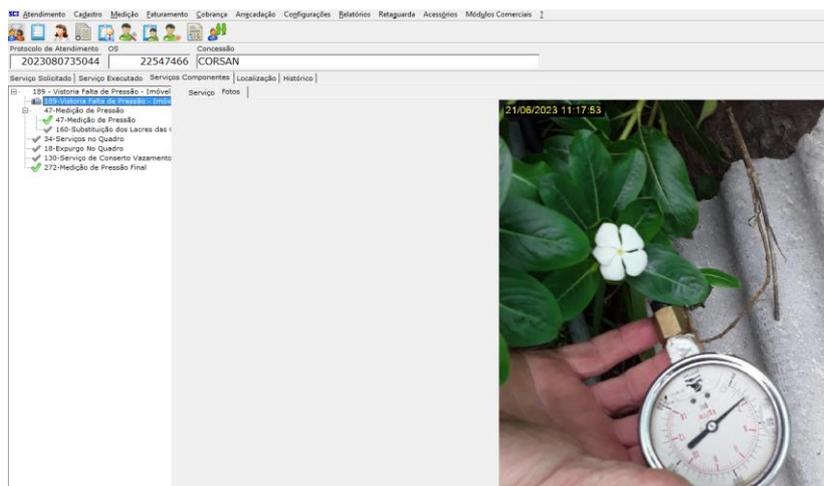

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
18	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 53,00 mca) na Rua Guaporé, n. 71 - coordenadas: 29°40'40,92"S e 51°5'7,809"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - processo n. 023-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 53,00 mca) na Rua Guaporé, n. 71 - coordenadas: 29°40'40,92"S e 51°5'7,809"W. O setor onde o imóvel está localizado tem sua pressão regulada pelo reservatório Ipiranga, que tem cotas em torno de 100m. A cota do imóvel é de cerca de 46m, justificando a pressão aferida pela AGESAN. É possível diminuir a pressão e realizar o atendimento dentro dos padrões do regulamento de serviços, para isso deve ser instalada VRP na rede em PVC PBA DN100 na Rua Wolfram Metzler próximo à esquina da Rua Sarandi, com controle de pressão a realizar no fim da Rua Esteio, com cotas em torno de 62m.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
19	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 63,34 mca) na Rua Emilio Von Reisswits, n. 212 - coordenadas: 29°41'20,959"S e 51°4'11,036"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - processo n. 023-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 63,34 mca) na Rua Emilio Von Reisswits, n. 212 - coordenadas: 29o41'20,959"S e 51o4'11,036"W O setor onde o imóvel está localizado tem sua pressão regulada pelo reservatório Ipiranga, que tem cotas em torno de 100m. A cota do imóvel é de cerca de 31m, justificando a pressão aferida pela AGESAN. É possível diminuir a pressão e realizar o atendimento dentro dos padrões do regulamento de serviços, para isso deve ser instalada VRP na rede em PVC PBA DN100 na Rua Professora Liane da Rosa próximo à esquina da Avenida São Leopoldo, com controle de pressão a realizar no colo alto da rua Rua Emilio Von Reisswits que tem cotas em torno de 65m. Também é possível realizar setorização de zona alta e baixa deste setor, porém necessita de obras de extensão de rede.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
20	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 78,68 mca) na Rua Manoel Leão Filho, n. 131 - coordenadas: 29°39'42,236"S e 51°3'14,654"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Campo Bom - processo n. 023-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 78,68 mca) na Rua Manoel Leão Filho, n. 131 - coordenadas: 29o39'42,236"S e 51o3'14,654"W O setor onde o imóvel está localizado tem sua pressão regulada pelo reservatório Jardim do Sol, que tem cotas em torno de 84m. A cota do imóvel é de cerca de 29m, porém a pressão é justificada pela ligação da rede de distribuição na linha de recalque da EEAT da Rua Hélio Klaser. É possível diminuir a pressão e realizar o atendimento dentro dos padrões do regulamento de serviços, para isso é necessário realizar obras de setorização com a interligação das redes na Rua João da Cunha esquina com João Pedro Dias (interligar PVC DEFOFO DN150 na rede de distribuição em PVC PBA DN85), além de fazer corte de rede na Rua João Pedro Dias esquina com Alameda da Inovação, assim passando o setor para o abastecimento da gravidade ETA.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

Gustavo Grams
Teixeira

Assinado de forma digital por Gustavo Grams Teixeira
Dados: 2023.06.23 17:07:08 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor – DEOM
Matricula 175224
