

Carta nº 735/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 04 de abril de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de pressões no município de Parobé.
Processo AGESAN número: 019/2025.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 836/2025, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização de pressões no município de Parobé, encaminhamos o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC em anexo, contemplando as considerações da Companhia a respeito das não conformidades apontadas, requerendo a aceitação das manifestações e informações apresentadas.

Ressaltamos que, considerando os artigos 2º e 3º da Resolução AGE nº 005/2024, bem como o item 2.1.2 – Envio do Ofício à Empresa do novo Manual de Fiscalização, e a emissão do Ofício nº 2532/2024, que trata do aviso de fiscalização de pressões no Município de Parobé, em 20/12/2024, adotou-se para o presente processo o Manual de Fiscalização disposto na Resolução AGO nº 003/2020, tendo em vista que os procedimentos fiscalizatórios iniciaram antes da data de vigência da Resolução AGE nº 005/2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

P/ Vinícius de Souza Jorge,
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 019/2025 – RTF

Município de Parobé- Vistoria realizada no dia 22 de janeiro de 2025

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 28 de março de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Leopoldo Hartz, n. 41 - Valor aferido 55,39 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	29°38'14" S 50°50'57" W

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Para redução da pressão na Rua Leopoldo Hartz a melhor solução é a instalação de uma VRP 40mm na entrada da rua, pois assim tem-se a garantia que outros setores não serão prejudicados.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão	02/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Dos Trilhos, n. 2035 - Valor aferido 54,33 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	29°37'52" S 50°51'17" W

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Para atendimento desta não conformidade será necessária a instalação de uma VRP na rede da Rua Paraíba, na esquina com a Rua dos Trilhos, para redução da pressão de todo o setor. O dimensionamento ideal da VRP será definido com o apoio da Modelagem Hidráulica para não gerar desabastecimento em nenhum outro setor atendido por essa rede.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão	02/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Maragatos, n. 230 - Valor aferido 53,38 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	29°36'45" S 50°49'35" W

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Para atendimento desta Não Conformidade será necessária a instalação de uma VRP na Rede PVC DN 75mm na entrada da Rua Agostin, na esquina com a Rua Mario Mosmann, a qual abastece toda essa localidade. O dimensionamento ideal da VRP será definido com o apoio da Modelagem Hidráulica para não gerar desabastecimento em nenhum outro setor atendido por essa rede.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão	02/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
4	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Batatais, n. 27 - Valor aferido 56,26 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	29°36'40" S 50°49'20" W

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O setor onde a Rua Batatais está inserida é abastecido por apenas uma entrada de água, portanto, para atendimento desta não conformidade, será instalada uma VRP na entrada no bairro, na Rua das Laranjeiras, e dessa forma, a pressão na região inteira será reduzida. O dimensionamento ideal da VRP será definido com o apoio da Modelagem Hidráulica para não gerar desabastecimento em nenhum outro setor atendido por essa rede.




PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão	02/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
5	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua José Joaquim dos Santos, n. 128 - Valor aferido 57,29 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	29°39'6" S 50°51'3" W

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Para atendimento desta Não Conformidade, o melhor ponto para instalação da VRP é na rede principal que alimenta o setor, localizada na Rua Heriberto Sander seguindo pela Rua Pedro Martins. O dimensionamento ideal da VRP será definido com o apoio da Modelagem Hidráulica, bem como a posição exata, visto que é uma área de grande abrangência e será necessária uma VRP de maior porte.

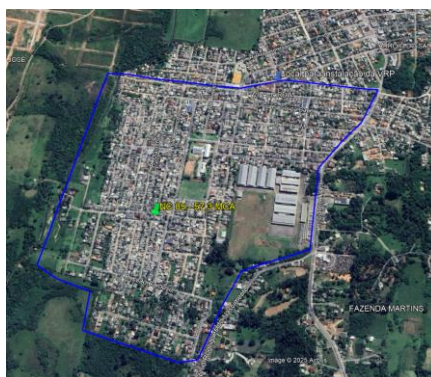

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão	02/09/2025

Nadir Albino
Becker Konrath

Assinado de forma digital por
Nadir Albino Becker Konrath
Dados: 2025.04.04 13:09:42
-03'00'

Nadir Albino Becker Konrath
Parobé - Nova Hartz – Igrejinha – Três Coroas
Coordenador de Operações



Documento assinado digitalmente
MARIANA BARBOSA DA COSTA
Data: 04/04/2025 13:40:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariana Barbosa da Costa
Coordenadoria de Perdas
Diretoria Sul
